

Modelo de Relatório de Instalação de VSAT

Projeto: PRODEMGE

Vodanet Telecomunicações Ltda.

Revisão do documento: 2.0

Outubro 2011



1) Histórico de Revisões

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO			
2.0	10/24/11	Revisão e reorganização geral do documento			
		Formatação final			



2) Objetivo

Este documento define o modelo do relatório a ser apresentado pela empresa instaladora para cada uma das instalações de unidade cliente para o projeto Prodemge.

O documento também define o foco de atenção requerido em cada um dos requisitos de instalação através de fotos de referencia apresentadas para cada um dos requisitos.

3) Requerimentos

Os itens abaixo identificam os requerimentos para as diferentes fases de instalação dos equipamentos VSAT nas dependências do cliente final.



4) Folha Resumo dos Dados de Instalaç $ilde{\mathbf{a}}$ o

1. LOCAL DA INSTALAÇÃO									
Designação do Cliente:SECRETARIA DA SAUDE MG OS :5095									
Endereço: AV DOM JOSE PEDRO	Complemento: CASA								
Bairro: BELA VISTA	Estado: MG								
CEP: Razão Social: PSF BELA VISTA									
Empresa fornecedora de energia: CEMIG No. Caixa de Registro:									
Nome do responsável do cliente: LARISSA AQUIAR RABELO Cargo: ENFERMEIRA									
Telefone: NÃO TEM Fax: NÃO POSSUI Email:									
2. TIPO DE ATIVIDADE									
XInstalação □Manutenção □Mudança de Endereço □Mudança de Local									
3. DADOS DA INSTALAÇÃO									
Latitude:18 36 32" S				Longitude:42 22 21'' W					
SNR (Rx):12.0 Eb/No (Tx):			EIRP 1	P fina\l: Isolação X-PoL: 12.0					
Throughput: Latencia:									
4. ANTENA									
Tipo de instalação da antena: XParedeLaje 🔲 Estrutura Metálica Outro:									
Fabricante:XSkyware□ ASC/Pro	delinBrasilsa	at□ Outro:		Diâmetro	: X 1,2m □ 1,8m □ Outro:				
5. IDU									
Fabricante: XSTM□ Outro: Modelo: XSL2000□ Outro:									
MAC:00:20:0E 10 5B3D Versão SW: 14.				No.		. Série: 0412030043			
6. ODU									
Fabricante: X STM Outro: Modelo: X SL4033 SL4035 Outro: No. Série: 0309060237									
7. IFL									
Tipo:X RGC-6 ☐ Outro: Fabricante: START				ABLE		Comprimento (m): 12X2			
8. ENERGIA AC									
Voltagem: X 110VAC ☐ 220VAC		Voltagem entre o	onduto	or neutro e condutor de	proteção (terra):			
Estabilizador: SimX Não				UPS ("No-Break"): ☐	SimX Não				
9. INFORMAÇÃO DO OPERADOR	R DE SATÉLI	TE(EUTELSAT)							
Nome:	Data:			Horário:	Ticket de Serviço:				
10. INFORMAÇÃO DO OPERADOR DO NOC(VODANET)									
Nome: ALBO			Data: 24/06/13		Horário 12.30				
11. INFORMAÇÃO DO CLIENTE RESPONSAVEL PELA ACEITAÇÃO DA INSTALAÇÃO									
Nome: LARISSA AQUIAR RABELO				Data: 24/06/13		Horário: 15.00			
Assinatura:									
12. COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES									
13. DECLARAÇÃO FINAL									
Declaro que o serviço de instalação foi realizado de acordo com o documento "Requerimentos Gerais para Instalação de VSAT" e que não existem pendências.									
Nome da Empresa Instaladora: SH SAT									
Nome do Técnico: ROGERIO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO R.G. MG 6 047932									
Assinatura:									



Figure 1 - Folha Resumo dos Dados de Instalação

5) Relatório Fotográfico

A seguir são identificados os itens que fazem parte do relatório fotográfico da instalação. As fotos utilizadas como exemplo identificam não só os itens mas também servem como referencia para demonstrar a qualidade requerida para a instalação.

5.1) Vista Geral do Local de Instalação

Prove uma visão geral do estabelecimento da instalação. Pelo menos duas fotos devem ser incluídas, uma destacando o edifício e outra que mostre a vizinhança ao redor.







5.2) Vista Geral da Superfície do Local de Instalação

Prove uma visão da superfície escolhida para a instalação da antena VSAT, seja um telhado, uma parede, uma estrutura metálica, etc. Pelo menos uma foto deve ser incluída.



5.3) Visualização do Ângulo de Azimutee Elevaçãoda Antena

Mostra o angulo de azimute e elevação relativo a posição escolhida para a instalação da antena e o edifício onde será instalada. Ao menos uma foto com linhas de azimute sobrepostas e identificação da direção Norte Geográfico ("True North").








5.4) Local de Instalação da IDU

Mostra com clareza a unidade IDU já instalada e detalhes dos arredores à unidade, mostrando presença de fiação, equipamentos, móveis, etc. Ao menos duas fotos são apresentadas.





5.5) Detalhe de Conexão do IDU à Tomada de Energia AC

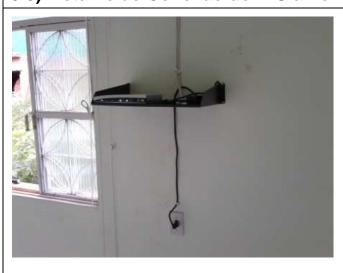



5.6) Detalhe do Equipamento de Proteção de Energiaou "No-Break"

Mostra detalhe do equipamento utilizado para proteção de energia ou "no-break", quando presente. Ao menos duas fotos mostrando o equipamento utilizado e detalhes da instalação.

5.7) Vista Geral dalnstalação da Antena e ODU

Prove uma visão geral da instalação já completa da antena e ODU. Ao menos uma foto mostrando a base, antena e ODU.



5.8) Detalhe da Instalação da Base da Antena e suaFixação

Nota: abaixo são apresentados duas fotos como exemplo, uma mostrando uma instalação num telhado e outra, numa parede.







5.9) Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena

Mostra os detalhes da fixação da base da antena. Ao menos quatro fotos com detalhes da fixação de cada um dos pontos de apoio da base da antena.





5.10) Conexão dos Cabos à unidade ODU

Mostra os detalhes dos cabos coaxiais IFL conectados a unidade ODU antes e depois da aplicação da fita de alta fusão. Ao menos duas fotos são incluídas.







5.11) Encaminhamento dos CabosCoaxiais (IFL)

Mostra os detalhes do encaminhamento dos cabos coaxiais (IFL) durante todo o percurso desde a unidade ODU até a unidade IDU.







