

	<h2 style="text-align: center;">Relatório – As Built</h2>	
---	---	---

1 - DADOS DO CLIENTE		DESIGNAÇÃO:	
Nome do Cliente: Sardoá			
Contato:		Telefone: (33) 3296-1139	
Endereço: Rua Padre Sady Rabelo, n° 121		Bairro: Centro	
Cidade: Sardoá		UF: MG	
CEP: 39728-000		E-mail:	
Empresa Fornecedora de Energia: CEMIG	Responsável:	Tel de contato:-	

2 - TIPOS DE ATIVIDADE					
<b>INSTALAÇÃO</b>	MANUTENÇÃO	TROCA DE MODALIDADE	MUDANÇA DE ENDEREÇO	MUDANÇA DE LAYOUT	DESINSTALAÇÃO

3 - DADOS DA INSTALAÇÃO:					
Latitude: 18°. 46'. 56,3		Longitude: 42°. 21'. 58,2			
Altitude (m): 653		Altura da antena em relação ao solo (m): 2,00 m			
SNR (Rx): 10.0	Eb/No (tx): 11,0	EIRP final: 48.5	Isolação X-Pol: 30.0	Throughput:	Latência:

4 - INSTALAÇÕES DA ANTENA	
Local de instalação:	
<input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> Na laje <input checked="" type="checkbox"/> Na parede <input type="checkbox"/> Estrutura metálica sobre o telhado <input type="checkbox"/> Outros	
Diâmetro: <input checked="" type="checkbox"/> 1,20m <input type="checkbox"/> 1,80m <input type="checkbox"/> Outro	
Fabricante: <input checked="" type="checkbox"/> Skyware <input type="checkbox"/> ASC/Prodelin : <input type="checkbox"/> Brasilsat <input type="checkbox"/> Outros	

5 - IDU			
Fabricante	<input checked="" type="checkbox"/> XSTM	<input type="checkbox"/> Outro	<input checked="" type="checkbox"/> XSI2000 <input type="checkbox"/> Outro
MAC: 00200e105351	Versão:	Nº Serie: 0411120069	

6 - ODU			
Fabricante	<input checked="" type="checkbox"/> XSTM	<input type="checkbox"/> Outro	<input type="checkbox"/> XSI4000 <input type="checkbox"/> Outro
<input checked="" type="checkbox"/> XSI4035	<input type="checkbox"/> Outro	Numero de Série: 0309060420	

7 - IFL			
Fabricante	FURUKAWA	Comprimento:-    08 metros	Tipo: RGC 6 <input checked="" type="checkbox"/> Outro

8 – ENERGIAS AC				
VOLTAGEM	<input checked="" type="checkbox"/> 110VAC	<input type="checkbox"/> 220VAC	Voltagem entre Conductor de proteção	Conductor Neutro e Terra:
Estabilizador	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	UPS (No-Break)	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

9 – INFORMAÇÕES DO OPERADOR DE SATELITE (EUTELSAT)				
NOME:-	Fabrice	Data:- 09/04/2013	Horario:- 16:40	Ticket de Serviço:

10 – INFORMAÇÕES DO OPERADOR DO NOC (VODANET)			
NOME:-	Pedro	Data:- 09/04/2013	Horário:- 17:00

11 – INFORMAÇÕES DO CLIENTE PELA ACEITAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
NOME:-	Natália	Data:- 09/04/2013	Horário:-
Assinatura:-			

12 – DESCRIÇÃO DO PERCURSO DO CABO: (ANTENA – MODEM):	

**13 – COMENTARIOS E OBSERVAÇÃO:****14 – DECLARAÇÃO FINAL:**

Declaro que o serviço de Instalação foi realizado de acordo com o documento “Requerimentos Gerais para Instalação de Vsat e que não existe pendências:

Nome da Empresa Instaladora: - Líder Serviços de Instalação e Comércio Ltda.:

Nome do Técnico: Victor Hugo Fonseca



RG: 16.209.629



Assinatura:

**15 – RELATORIO FOTOGRAFICO:**

**15-1 Vista Geral do Local de Instalação****15-2 Vista Geral do Local da superfície da instalação**

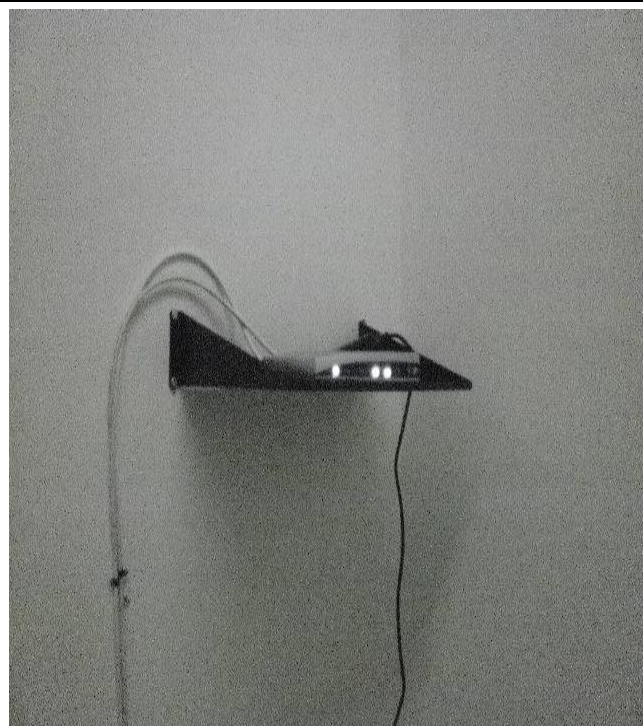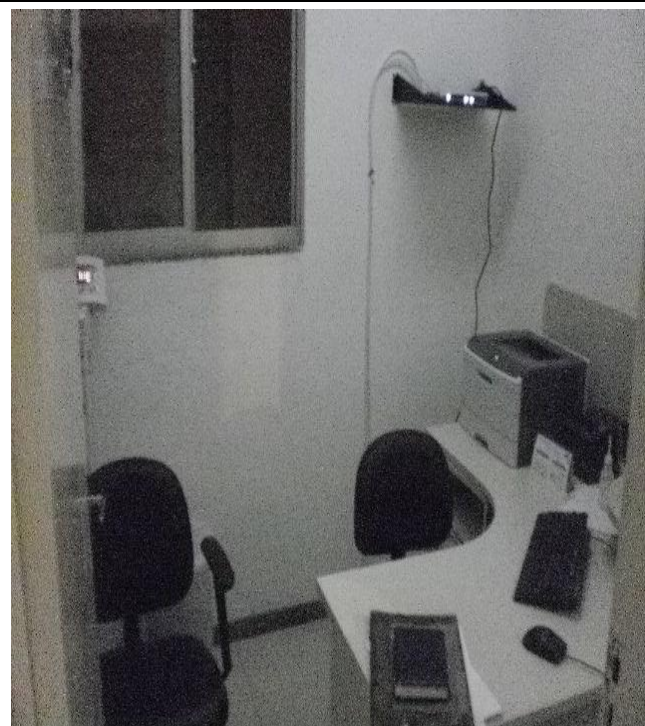

**15-3 Visualização do Azimute e Elevação da Antena****15-4 Local da Instalação da Idu**

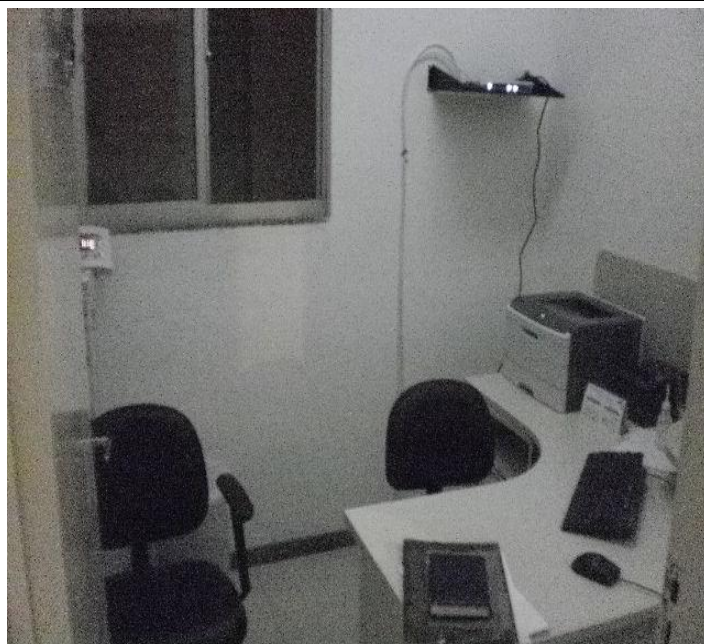**15-5 Detalhe da Conexão do IDU à tomada de Energia AC****15-6 Detalhe do Equipamento de Proteção de Energia ou “No Break”**



15-7 Vista Geral da Instalação da Antena e Odu





15-8 Detalhe da Base da Instalação da Base da Antena e sua Fixação



15-9 Detalhe da Fixação dos Pés da Base da Antena



15-10 Conexão dos Cabos á Unidade ODU

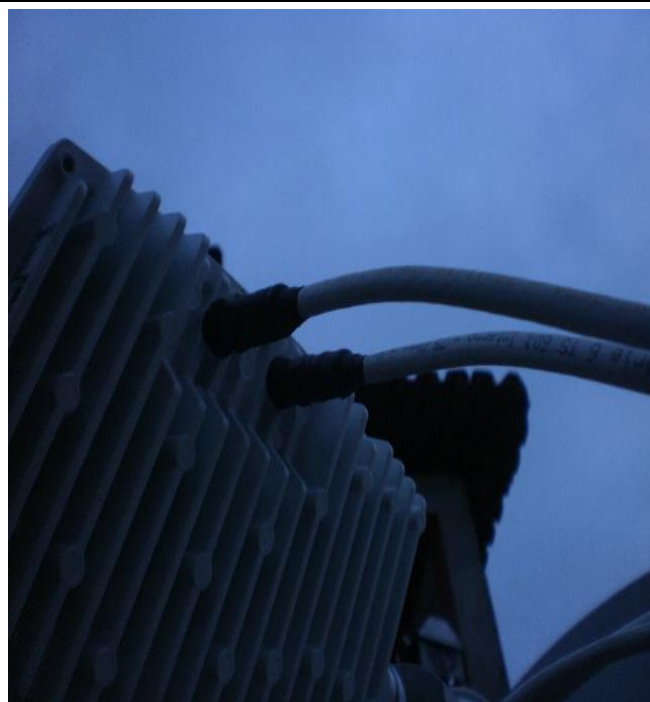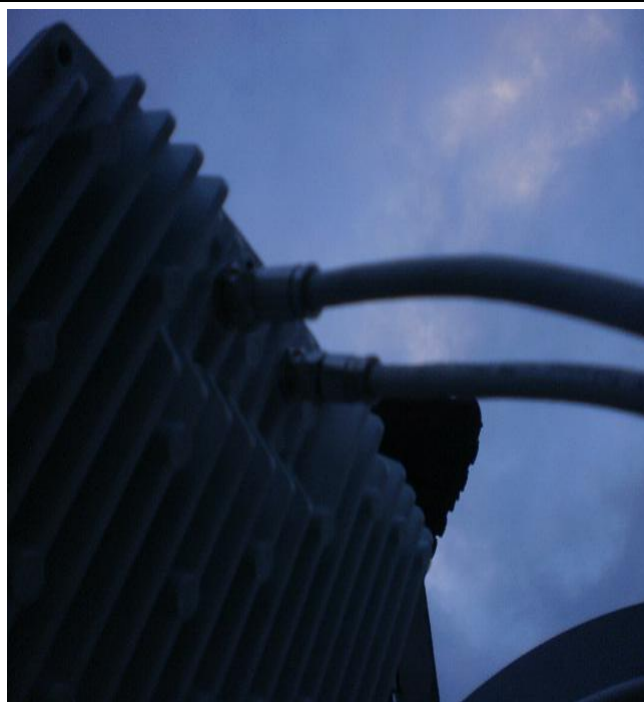



**15-11 Encaminhamentos dos Cabos Coaxiais (IFL)**
